


工事総合進捗表

A

当月における工事の総合的な進行状況は、次の通りであります。
(工事予定工期)

施工の進捗

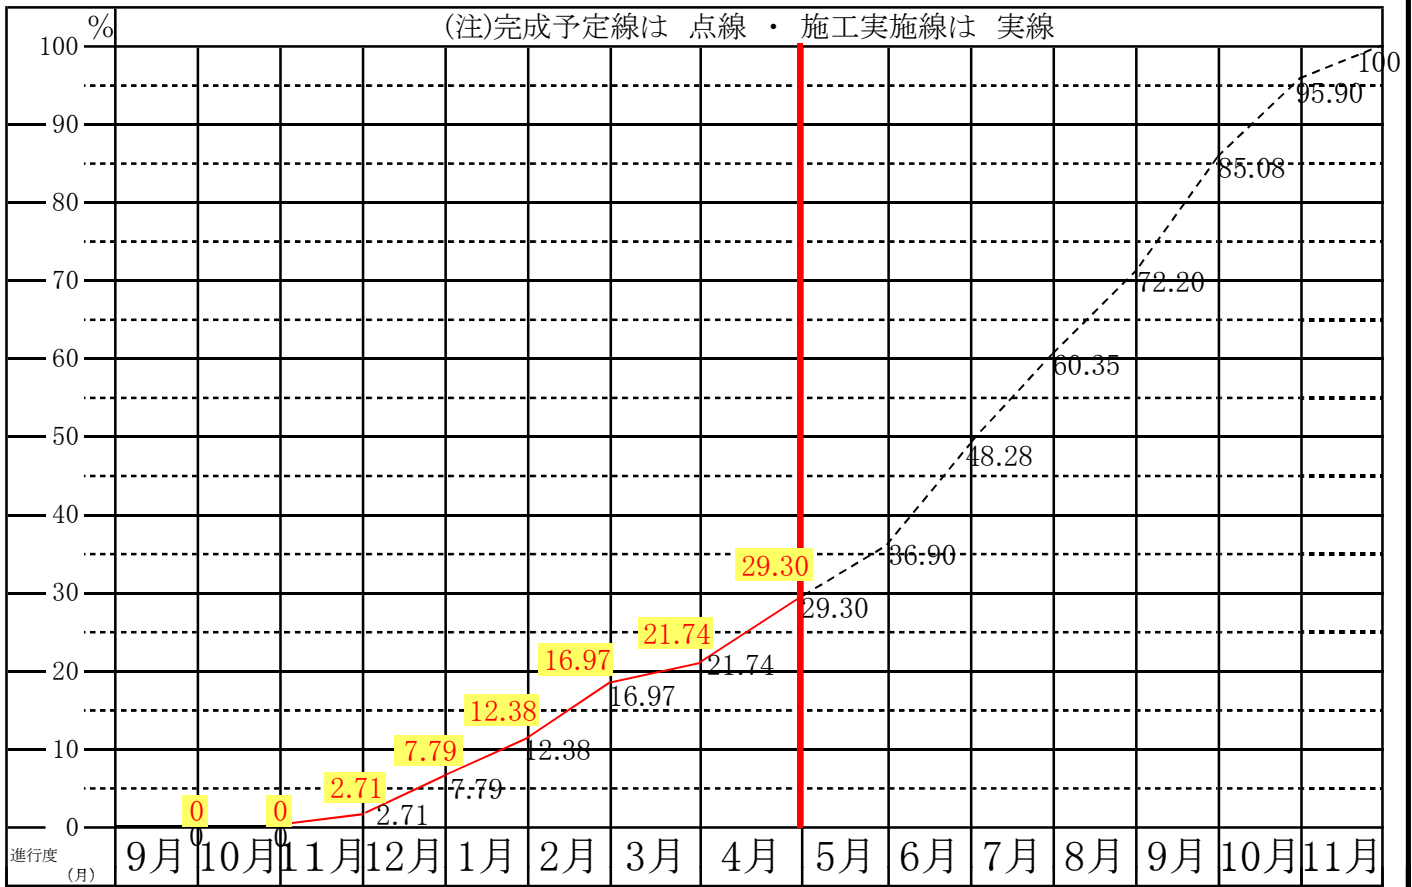

4月の記事

日	曜日	天気	記事	日	曜日	天気	記事
1	土			17	月	●	【1工区】2Fデッキスラブ張り 【2工区】PCW挿入 【車庫1】基礎型枠 【車庫2】基礎配筋
2	日			18	火	◎	
3	月	◎	PC工事段取 【車庫1】墨出し 【車庫2】墨出し	19	水	◎	鉄骨階段2取付 アンカー調整 基礎型枠
4	火	◎	杭頭補強筋	20	木	○	2Fスラブ配筋 2Fバルコニー版据付 基礎CON
5	水	○	【1工区】PC柱建方	21	金	◎	養生
6	木	○		22	土	◎	2Fデッキスラブ張り
7	金	○	PC 2F梁架け	23	日		
8	土	○		24	月	◎	
9	日		アンカーセット	25	火	◎	2Fスラブ配筋 型枠解体
10	月	●	PCW挿入	26	水	○	2FCON止め、段差枠入
11	火	○		27	木	◎	2Fバルコニー版据付
12	水	◎	鉄骨階段1取付 【2工区】PC柱建方	28	金	◎	2FスラブCON
13	木	◎		29	土	◎	2Fスラブ墨出し
14	金	◎	2Fデッキ張り PC梁架け	30	日		
15	土	○					
16	日						

当月の作業に支障を及ぼした天候状態

凡例 晴れ◎ 曇○ 雨● 暴風雨⊗ 雪⊕

当月の作業に支障を及ぼした天候状態

天候の状態による 作業不能日数	0日	定休日数	6日	実作業日数	24日
--------------------	----	------	----	-------	-----


工 事 別 進 度 表

B

[A] 工事の総合的な進行状態に対して、その工事別の進行状態は、次の通りであります。

種 別		完成予定工事量											工種 全体 (%)	工事の 進捗率				
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月			8月	9月	10月	11月
仮設	共通仮設工事																2.53	40%
	直接仮設工事																3.20	40%
基礎工事	土工事																0.77	80%
	杭地業工事																5.15	100%
躯体工事	コンクリート工事																2.70	50%
	型枠工事																3.89	50%
	鉄筋工事																2.31	50%
	鉄骨工事																3.05	11%
	既製コンクリート工事																18.19	38%
仕上工事	防水工事																1.05	0%
	タイル工事																0.19	0%
	木工事																0.13	0%
	金属工事																3.87	0%
	左官工事																1.14	15%
	金属製建具工事																6.36	0%
	硝子工事																0.51	0%
	塗装工事																0.98	0%
	内外装工事																4.45	0%
	仕上ユニット工事																0.43	0%
	雑工事																1.10	0%
	外 構	外構工事															2.15	0%
適用	昇降機設備工事																0.73	0%
	厨房機器設備工事																0.25	0%
	橋梁新設工事																2.04	15%
	電気設備工事																7.75	25%
	機械設備工事																19.4	25%
	現場管理費																5.7	40%
											計	100 %	29.30 %	(出来高)				


適 用



開始



完成



工事進捗




完成工期


工事出来高図

C

当月の施工部分は、次の建物図面にそれぞれ色付けした部分であります。

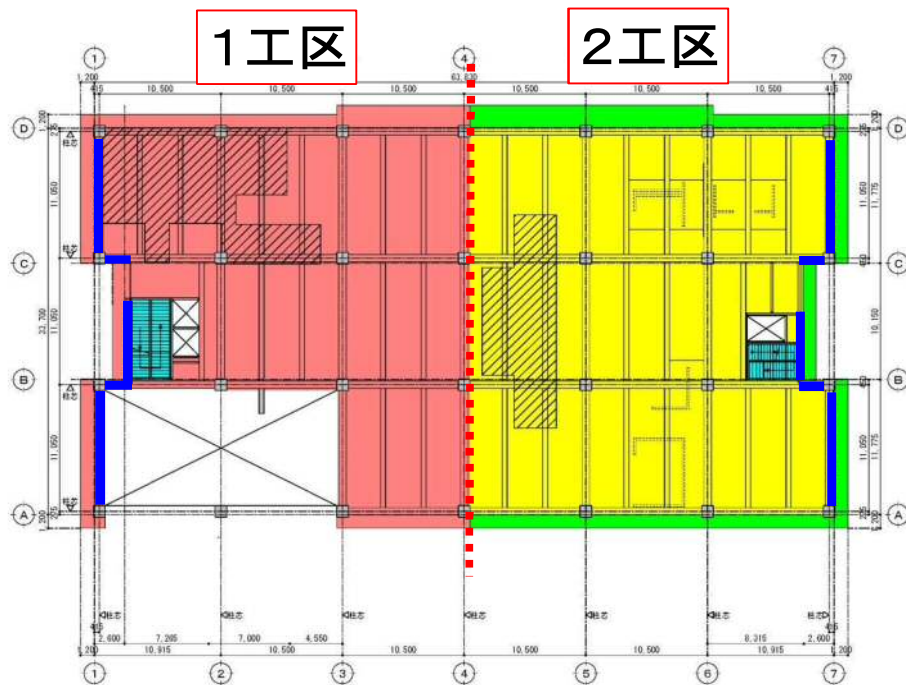

健診センター

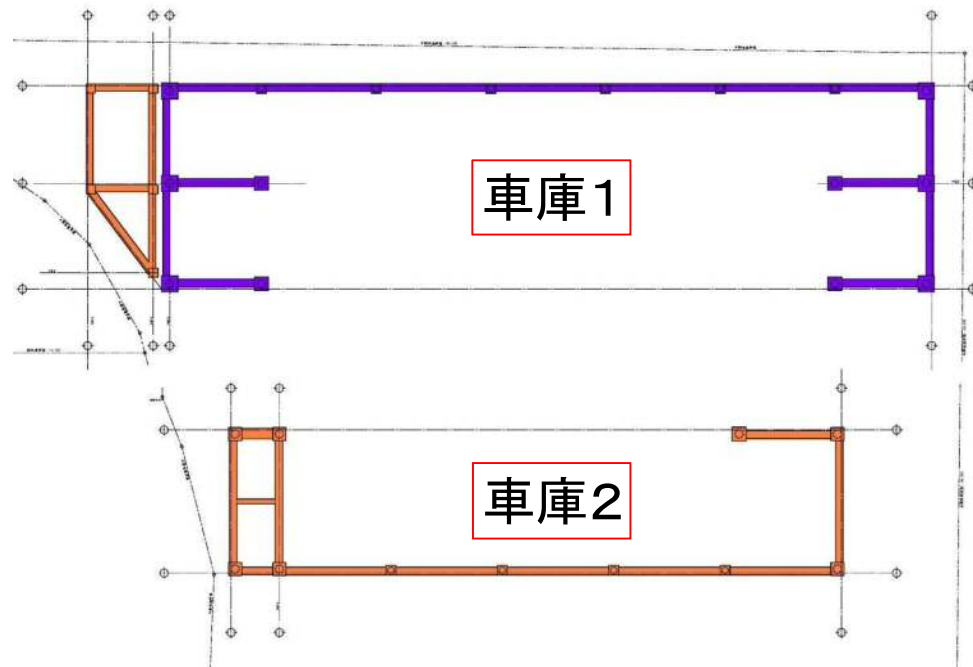

健診バス車庫1・2

工事写真撮影箇所・内容			工種色分け(主工程)		
1	1工区 2F PC梁架設状況	7	健診センター 全景写真(南西面より)	コンクリート工事(2FスラブCON完了)	コンクリート工事(基礎・地中梁CON完了)
2	1工区 2Fデッキスラブ張り完了	8	健診センター 全景写真(南東面より)	鉄筋工事(2Fスラブ配筋施工中)	型枠工事(基礎・地中梁型枠建込完了)
3	1工区 2Fスラブ配筋完了			鉄骨工事(1F~2F 階段1・2取付完了)	
4	1工区 2FスラブCON打設完了			PC工事(2Fバルコニー掘付完了)	
5	2工区 2F PC梁架設状況			外壁工事(1Fスバンクリート取付完了)	
6	2工区 2Fデッキ・在来スラブ張り完了				

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 1 1工区 2F PC梁架設状況



撮影内容 2 1工区 2Fデッキ張り完了

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 3 1工区 2Fスラブ配筋完了



撮影内容 4 1工区 2Fスラブコンクリート打設完了

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 5 2工区 2F梁架設状況



撮影内容 6 2工区 2Fデッキ・在来スラブ張り完了

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 7 全景写真(南西面より) 4月29日現在



撮影内容 8 全景写真(南東面より) 4月29日現在
