


工 事 総 合 進 度 表

A

当月における工事の総合的な進行状況は、次の通りであります。
(工事予定工期)

施工の進度

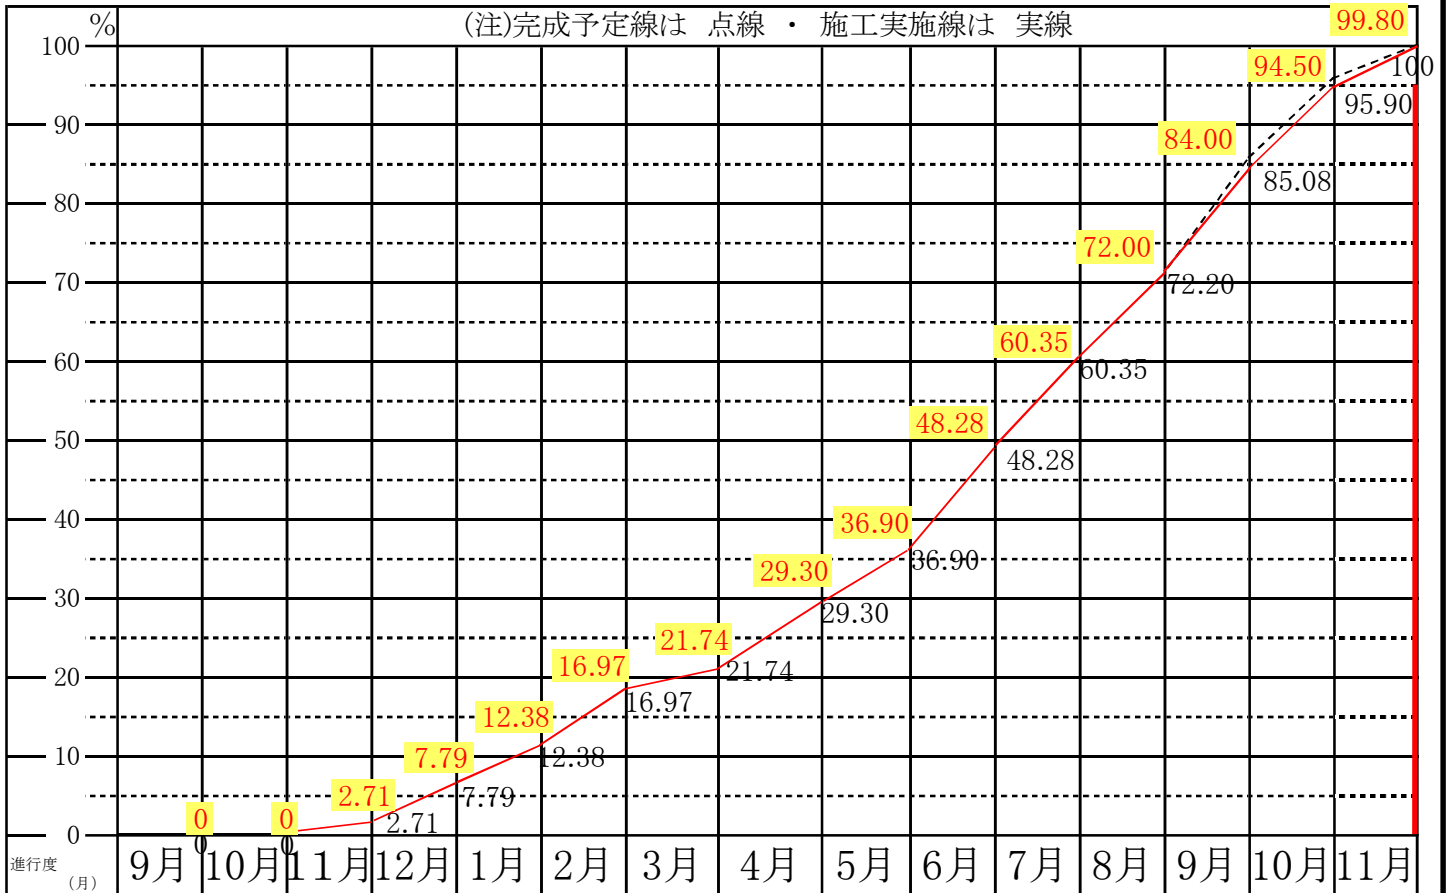

11 月 の 記 事

日	曜日	天気	記事	日	曜日	天気	記事
1	水	☉	各階 内部仕上・調整・美装工事 外構工事	17	金	○	各階 内部手直し・調整工事 外構工事
2	木	○		18	土	☉	
3	金	☉		19	日	☉	
4	土	☉		20	月	☉	消防検査
5	日	☉		21	火	☉	行政検査
6	月	☉		22	水	●	設計検査
7	火	○		23	木	☉	施主検査
8	水	○		24	金	☉	
9	木	☉		25	土	○	
10	金	☉		26	日	○	
11	土	☉		27	月	☉	
12	日	☉		28	火	☉	植栽工事 (AS舗装 北・西面)
13	月	☉		29	水	○	(AS舗装 南面)
14	火	☉		30	木	○	取扱説明会
15	水	☉		1	金	☉	引渡し 残工事・追加工事
16	木	☉	社内検査	2	土	☉	

当月の作業に支障を及ぼした天候状態

 凡例 晴れ ☉ 曇 ○ 雨 ● 暴風雨 ⊗ 雪 ⊕

当月の作業に支障を及ぼした天候状態

天候の状態による 作業不能日数	0 日	定休日数	0 日	実作業日数	30 日
--------------------	-----	------	-----	-------	------

工 事 別 進 度 表

B

[A] 工事の総合的な進行状態に対して、その工事別の進行状態は、次の通りであります。

種 別		完 成 予 定 工 事 量															工種 全体 (%)	工事の 進 度 率
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
仮設	共通仮設工事																2.53	100%
	直接仮設工事																3.20	100%
基礎工事	土工事																0.77	100%
	杭地業工事																5.15	100%
躯体工事	コンクリート工事																2.70	100%
	型枠工事																3.89	100%
	鉄筋工事																2.31	100%
	鉄骨工事																3.05	100%
	既製コンクリート工事																18.19	100%
仕上工事	防水工事																1.05	100%
	タイル工事																0.19	100%
	木工事																0.13	100%
	金属工事																3.87	100%
	左官工事																1.14	100%
	金属製建具工事																6.36	100%
	硝子工事																0.51	100%
	塗装工事																0.98	100%
	内外装工事																4.45	100%
	仕上ユニット工事																0.43	100%
	雑工事																1.10	100%
	外 構	外構工事																2.15
	昇降機設備工事																0.73	100%
	厨房機器設備工事																0.25	100%
	橋梁新設工事																2.04	100%
	電気設備工事																7.75	100%
	機械設備工事																19.4	100%
	現場管理費																5.7	100%
																		計 100 %

適 用



開始



完成



工事進度






完成工期

工事出来高図

C

当月の施工部分は、次の建物図面にそれぞれ色付けした部分であります。

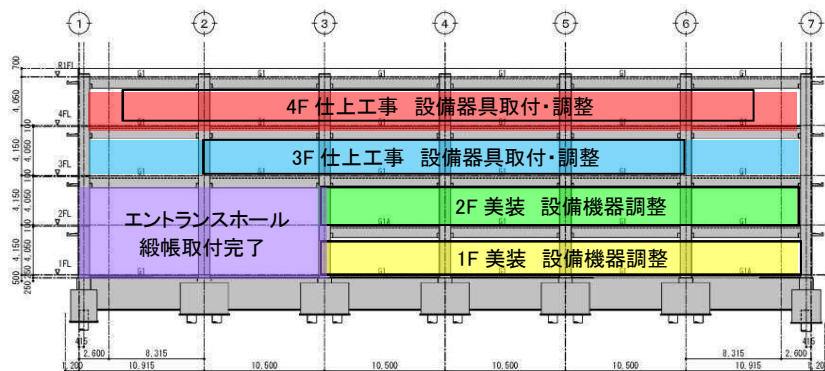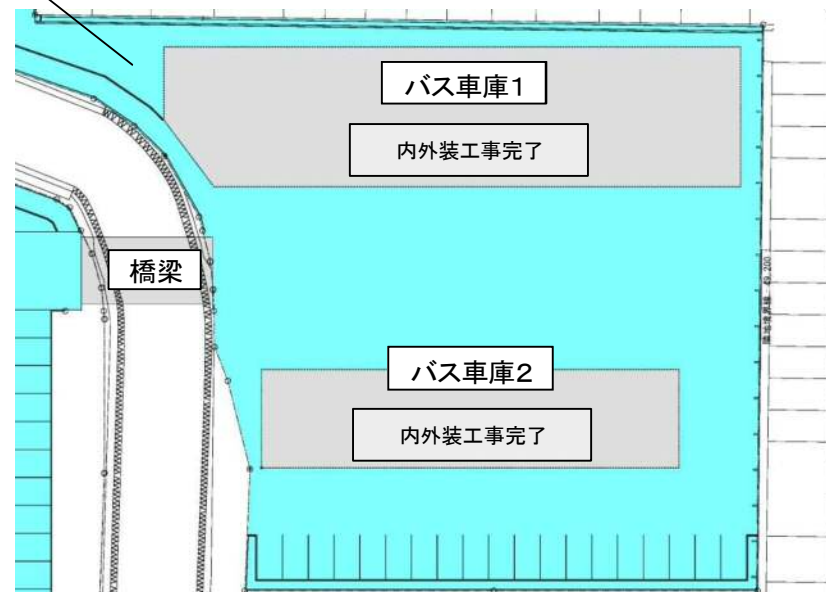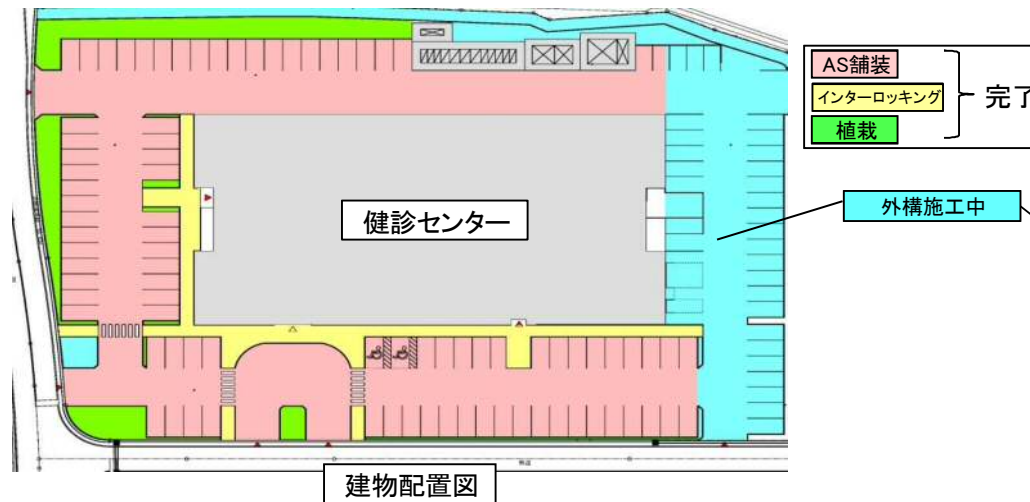

軸組図

健診センター

バス車庫

工事写真撮影箇所・内容

1	1F エントランスホール	7	4F 佐賀県医師会事務室
2	1F 廊下	8	4F ホワイエ ~ 廊下2
3	2F 待合ホール	9	健診センター 全景写真(南西面より)
4	2F 待合廊下	10	健診センター 全景写真(南東面より)
5	3F 生化学・血液一般・免疫血清検査室		
6	3F 会議・研修室1,2		

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 1 1F エントランスホール



撮影内容 2 1F 廊下

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 3

2F 待合ホール



撮影内容 4

2F 待合廊下

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 5 3F 生化学・血液一般・免疫血清検査室



撮影内容 6 3F 会議・研修室1, 2

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 7 4F 佐賀県医師会事務室



撮影内容 8 4F ホワイエ～廊下2

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 9 健診センター 全景写真(南西面より) 11月30日現在



撮影内容 10 健診センター 全景写真(南東面より) 11月25日現在
