


工 事 総 合 進 度 表

A

当月における工事の総合的な進行状況は、次の通りであります。
(工事予定工期)

施工の進度

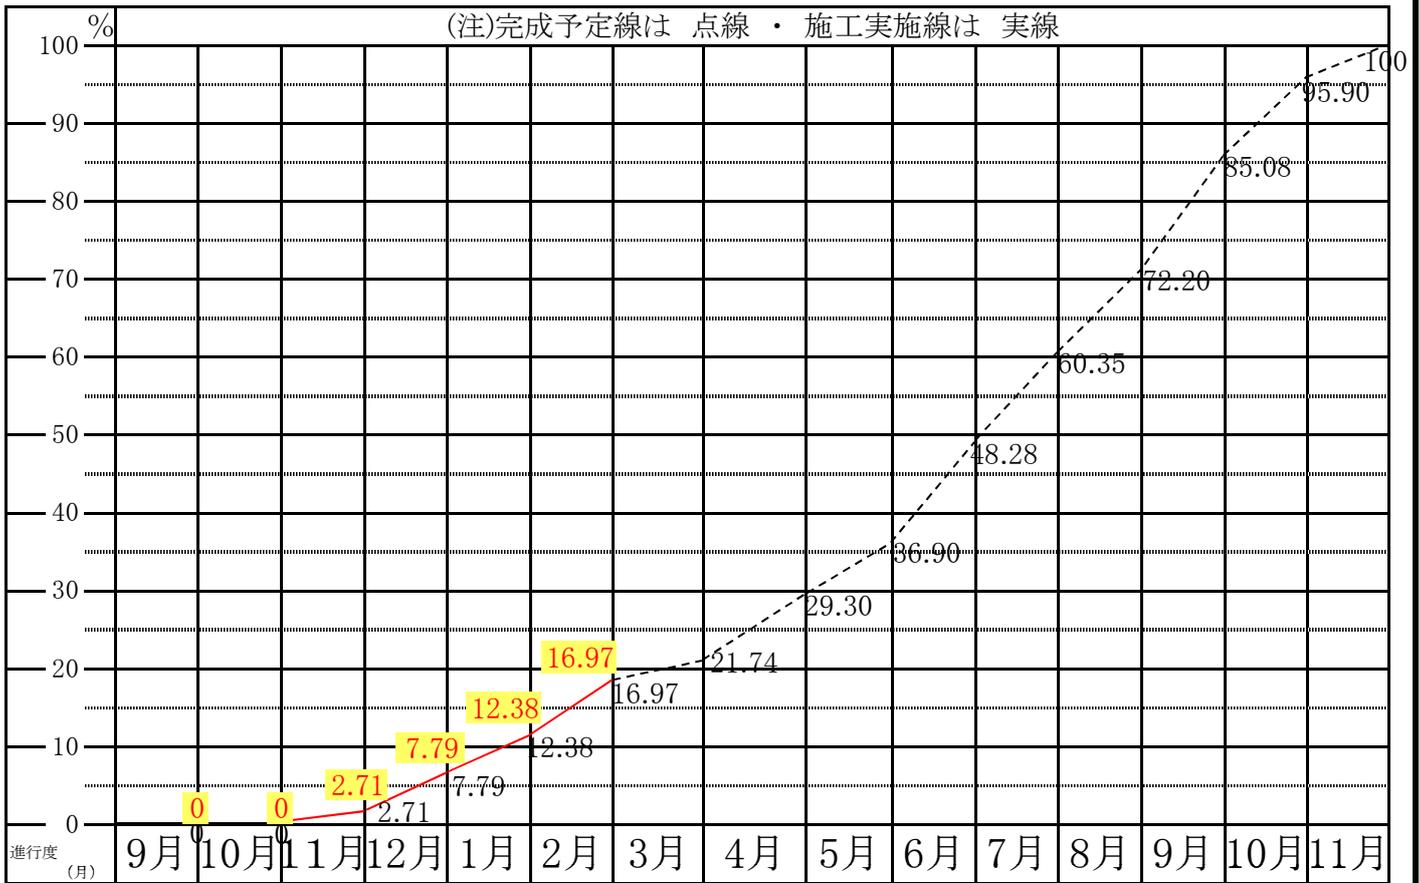

2 月 の 記 事

日	曜日	天気	記事	日	曜日	天気	記事
1	水	☉	【B工区】基礎・地中梁型枠 【C工区】基礎・地中梁配筋 【D工区】杭頭補強筋・アンカーセット	17	金	☉	【A工区】埋戻し、砕石地業 【B工区】足場解体 【C工区】 【D工区】基礎・地中梁型枠
2	木	☉		18	土	☉	埋戻し、砕石地業
3	金	☉	【A工区】基礎型枠解体	19	日		全休
4	土	☉		20	月	☉	基礎型枠解体
5	日		全休	21	火	☉	・PC製品検査(柱・梁)
6	月	☉	足場解体 基礎・地中梁型枠 基礎・地中梁配筋	22	水	☉	足場解体
7	火	☉		23	木	☉	【D工区】基礎・地中梁CON
8	水	☉		24	金	☉	【車庫1・2】縄張り検査
9	木	☉	埋戻し、砕石地業 基礎・地中梁CON	25	土	☉	埋戻し、砕石地業
10	金	⊕		26	日		全休
11	土	☉		27	月	☉	底盤配筋
12	日		全休	28	火	☉	十間下捨てCON 【車庫1】試験掘
13	月	☉	・PC製品検査(バルコニー) 基礎型枠解体 基礎・地中梁型枠				
14	火	☉					
15	水	☉	足場解体				
16	木	☉	基礎・地中梁CON				

当月の作業に支障を及ぼした天候状態 凡例 晴れ ☉ 曇 ☉ 雨 ● 暴風雨 ⊗ 雪 ⊕

当月の作業に支障を及ぼした天候状態

天候の状態による 作業不能日数	0 日	定休日数	4 日	実作業日数	24 日
--------------------	-----	------	-----	-------	------

工 事 別 進 度 表

B

[A] 工事の総合的な進行状態に対して、その工事別の進行状態は、次の通りであります。


種 別		完成予定工事量															工種 全体 (%)	工事の 進捗率	
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
仮設	共通仮設工事	[Progress bars]															2.53	33%	
	直接仮設工事	[Progress bars]															3.20	33%	
基礎工事	土工事	[Progress bars]															0.77	40%	
	杭地業工事	[Progress bars]															5.15	70%	
躯体工事	コンクリート工事	[Progress bars]															2.70	33%	
	型枠工事	[Progress bars]															3.89	32%	
	鉄筋工事	[Progress bars]															2.31	31%	
	鉄骨工事	[Progress bars]															3.05	0%	
	既製コンクリート工事	[Progress bars]															18.19	20%	
仕上工事	防水工事	[Progress bars]															1.05	0%	
	タイル工事	[Progress bars]															0.19	0%	
	木工事	[Progress bars]															0.13	0%	
	金属工事	[Progress bars]															3.87	0%	
	左官工事	[Progress bars]															1.14	0%	
	金属製建具工事	[Progress bars]															6.36	0%	
	硝子工事	[Progress bars]															0.51	0%	
	塗装工事	[Progress bars]															0.98	0%	
	内外装工事	[Progress bars]															4.45	0%	
	仕上ユニット工事	[Progress bars]															0.43	0%	
	雑工事	[Progress bars]															1.10	0%	
外 構	外構工事	[Progress bars]															2.15	0%	
適用	昇降機設備工事	[Progress bars]															0.73	0%	
	厨房機器設備工事	[Progress bars]															0.25	0%	
	橋梁新設工事	[Progress bars]															2.04	12.5%	
	電気設備工事	[Progress bars]															7.75	10%	
	機械設備工事	[Progress bars]															19.4	10%	
	現場管理費	[Progress bars]															5.7	30%	
																	計	100 %	16.97 %

(出来高)

適 用



開始



完成



工事進捗




完成工期

工事出来高図

C

当月の施工部分は、次の建物図面にそれぞれ色付けした部分であります。

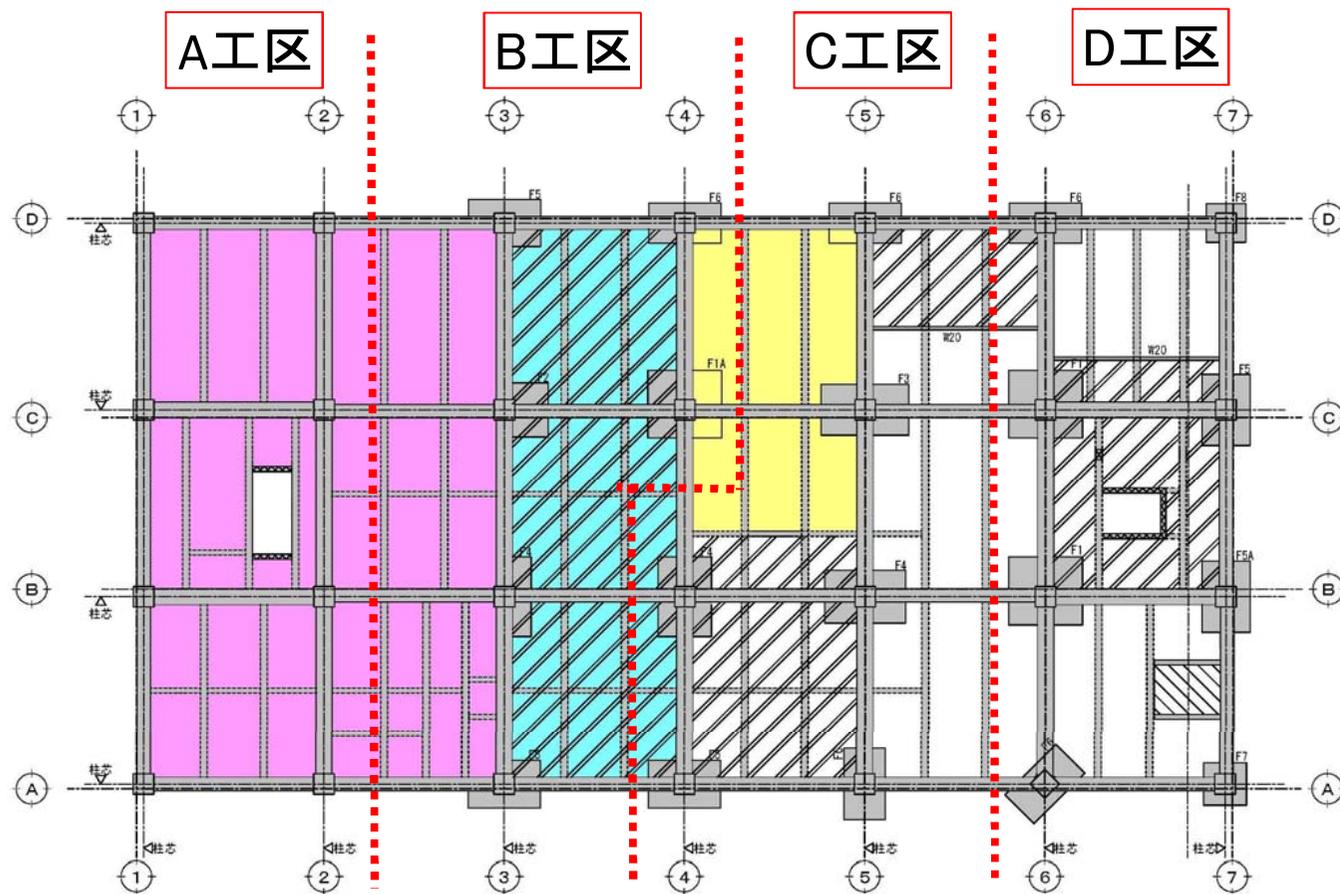

工事写真撮影箇所・内容			工種色分け(主工程)		
1	A工区 基礎・地中梁CON出来形検査	7	全景写真		コンクリート工事(基礎・地中梁CON完了)
2	B工区 基礎・地中梁打設前検査	8	全景写真		コンクリート工事(土間下捨てCON完了)
3	C工区 基礎・地中梁配筋検査				鉄筋工事(底盤配筋完了)
4	D工区 基礎・地中梁配筋検査				土工事(埋戻し、砕石地業施工中)
5	D工区 基礎・地中梁CON打設状況				
6	B・C工区 基礎・地中梁CON出来形				

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 1 A工区 基礎・地中梁CON出来形検査



撮影内容 2 B工区 基礎・地中梁CON打設前検査状況

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 3 C工区 基礎・地中梁配筋検査



撮影内容 4 D工区 基礎・地中梁配筋検査

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 5 D工区 基礎・地中梁CON打設状況



撮影内容 6 B・C工区 コンクリート出来形

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 7 全景写真 2月25日現在



撮影内容 8 全景写真 2月25日現在
