


工 事 総 合 進 度 表

A

当月における工事の総合的な進行状況は、次の通りであります。
(工事予定工期)

施工の進度

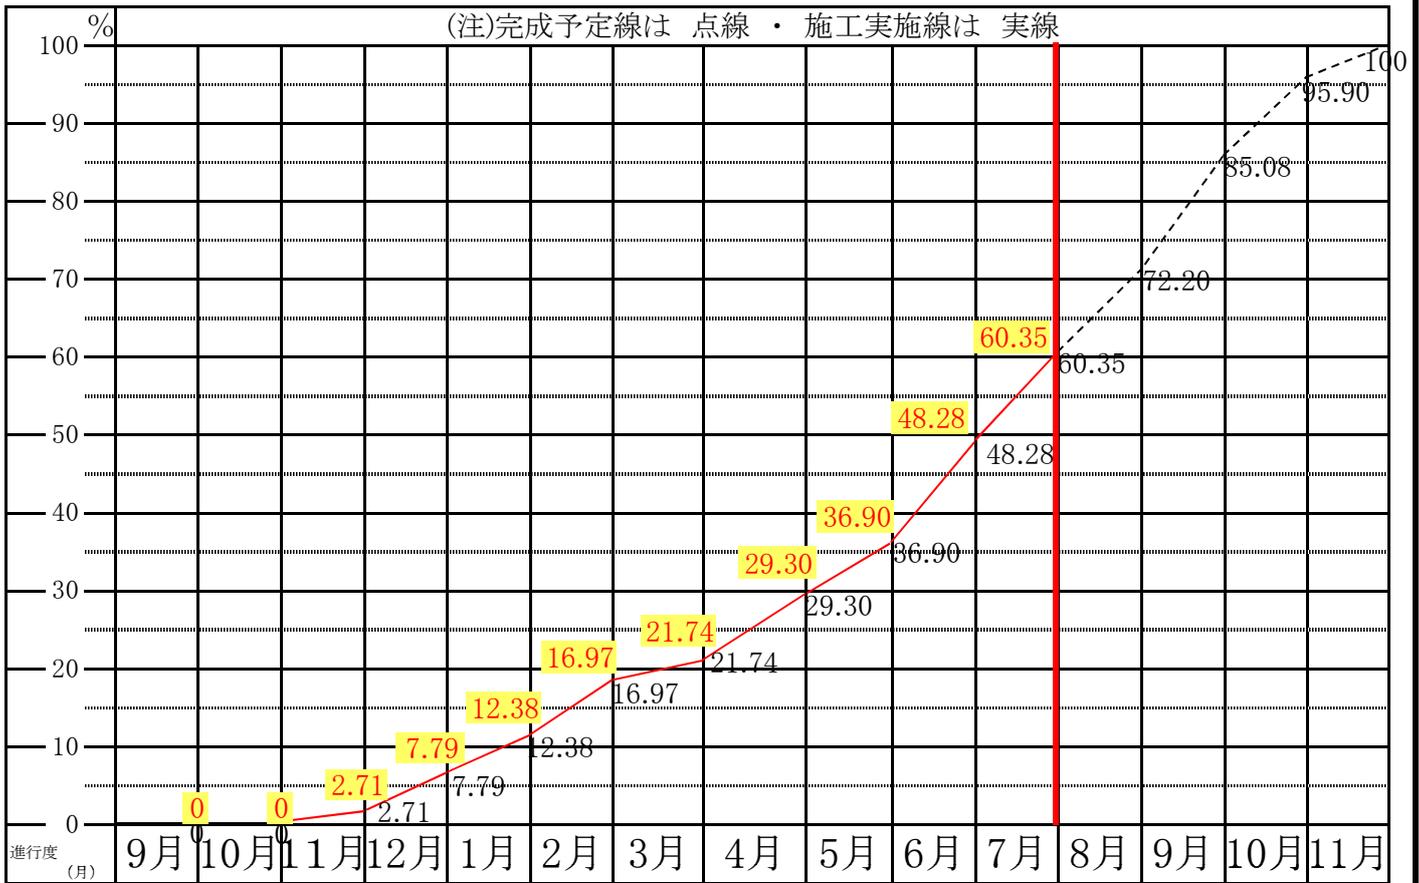

7 月 の 記 事

日	曜日	天気	記事				日	曜日	天気	記事			
1	土	☉	【1工区】RF外部足場組	【2工区】4Fスラブ配筋	【内装工事】1・2F壁・天井LGS	【2号橋】護岸復旧・埋戻し	17	月	☉	【1工区】RFスラブ配筋	【2工区】RF PCW挿入	【内装工事】3F区画壁下地組	【2号橋】桁架設段取
2	日						18	火	○	RFバルコニー版	RF鉄骨取付	2F SD取付	
3	月	☉		4Fコン止め	1F SD取付		19	水	☉		RFデッキ張り		
4	火	○					20	木	☉	RFコン止め			
5	水	☉	RF PC梁架設			沓座型枠・モルタルアンカー設置	21	金	☉			3F区画壁ボード張り	桁架設
6	木	○					22	土	☉		RFデッキインサート		桁間詰めCON
7	金	○	RF PCW挿入		1F壁ボード張り		23	日					養生
8	土	☉		4FスラブCON			24	月	○				
9	日						25	火	☉		RFスラブ配筋	RFバルコニー版	2F AW取付
10	月	○	RF鉄骨取付	RF外部足場組			26	水	☉	RFスラブCON			緊張・グラウト
11	火	☉	RFデッキ張り				27	木	☉	養生			地覆
12	水	☉					28	金	☉	パラベット・機械基礎鉄筋・型枠	RFコン止め		鉄筋・型枠
13	木	☉		RF PC梁架設		型枠解体・仕上げ	29	土	☉				
14	金	☉	RFデッキインサート				30	日					
15	土	☉		RF PCW挿入			31	月	☉				
16	日						1	火	☉		RFスラブCON(上棟)		

当月の作業に支障を及ぼした天候状態

凡例 晴れ ☉ 曇 ○ 雨 ● 暴風雨 ⊗ 雪 ⊕




当月の作業に支障を及ぼした天候状態

天候の状態による 作業不能日数	0 日	定休日数	5 日	実作業日数	26 日
--------------------	-----	------	-----	-------	------

工 事 別 進 度 表

B


[A] 工事の総合的な進行状態に対して、その工事別の進行状態は、次の通りであります。

種 別		完 成 予 定 工 事 量														工種 全体 (%)	工事の 進 度 率		
大分類	工事名	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			11月	
仮設	共通仮設工事																2.53	70%	
	直接仮設工事																3.20	70%	
基礎工事	土工事																0.77	100%	
	杭地業工事																5.15	100%	
躯体工事	コンクリート工事																2.70	85%	
	型枠工事																3.89	80%	
	鉄筋工事																2.31	85%	
	鉄骨工事																3.05	55%	
	既製コンクリート工事																18.19	80%	
仕上工事	防水工事																1.05	20%	
	タイル工事																0.19	0%	
	木工事																0.13	0%	
	金属工事																3.87	40%	
	左官工事																1.14	60%	
	金属製建具工事																6.36	30%	
	硝子工事																0.51	20%	
	塗装工事																	0.98	4%
	内外装工事																	4.45	40%
	仕上ユニット工事																	0.43	0%
	雑工事																	1.10	10%
	外 構	外構工事																2.15	0%
適用	昇降機設備工事																0.73	0%	
	厨房機器設備工事																0.25	0%	
	橋梁新設工事																2.04	80%	
	電気設備工事																7.75	55%	
	機械設備工事																19.4	55%	
	現場管理費																5.7	68%	
計																100 %	60.35 %		
(出来高)																			
適 用		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>開始</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>完成</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>工事進度</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>完成工期</p> </div> </div>																	


工事出来高図

C

当月の施工部分は、次の建物図面にそれぞれ色付けした部分であります。

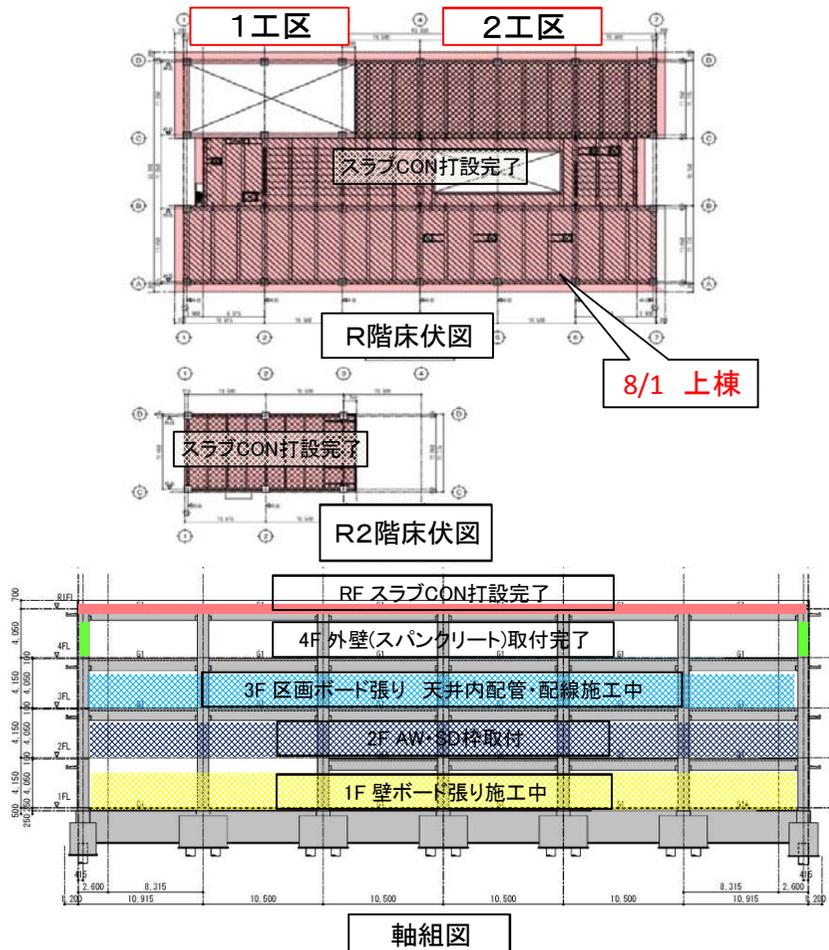

健診センター

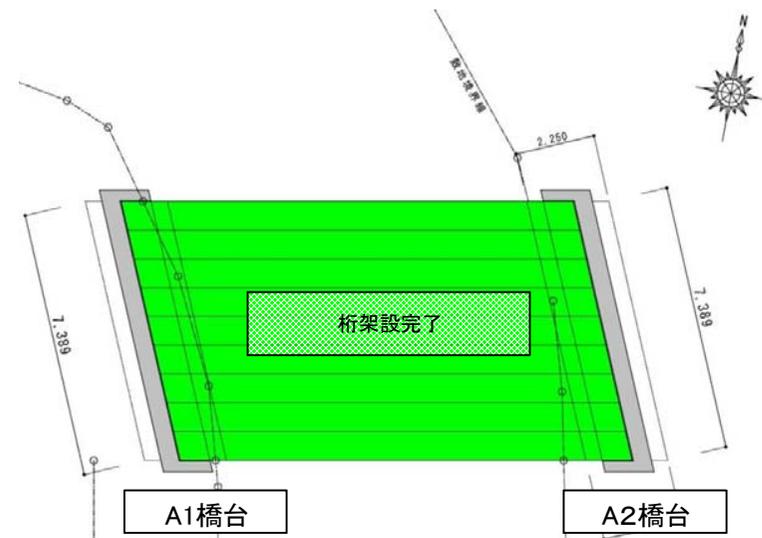

2号橋

工事写真撮影箇所・内容

1	2工区 4Fスラブ配筋完了	7	2工区 RFスラブ配筋完了	13	健診センター 全景写真(南西面より)
2	2工区 4Fコンクリート打設完了	8	2工区 RFスラブコンクリート打設完了	14	健診センター 全景写真(南東面より)
3	1工区 RF PC梁架設完了	9	1F 壁ボード張り状況		
4	1工区 RFデッキ張り完了	10	2F 壁軽鉄下地組状況		
5	1工区 RFスラブコンクリート打設完了	11	3F 天井内配管・配線状況		
6	2工区 RF PC梁架設完了	12	橋梁 桁架設完了		

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 1 2工区 4Fスラブ配筋完了




撮影内容 2 2工区 4Fスラブコンクリート打設完了

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 3 1工区 RF PC梁架設完了

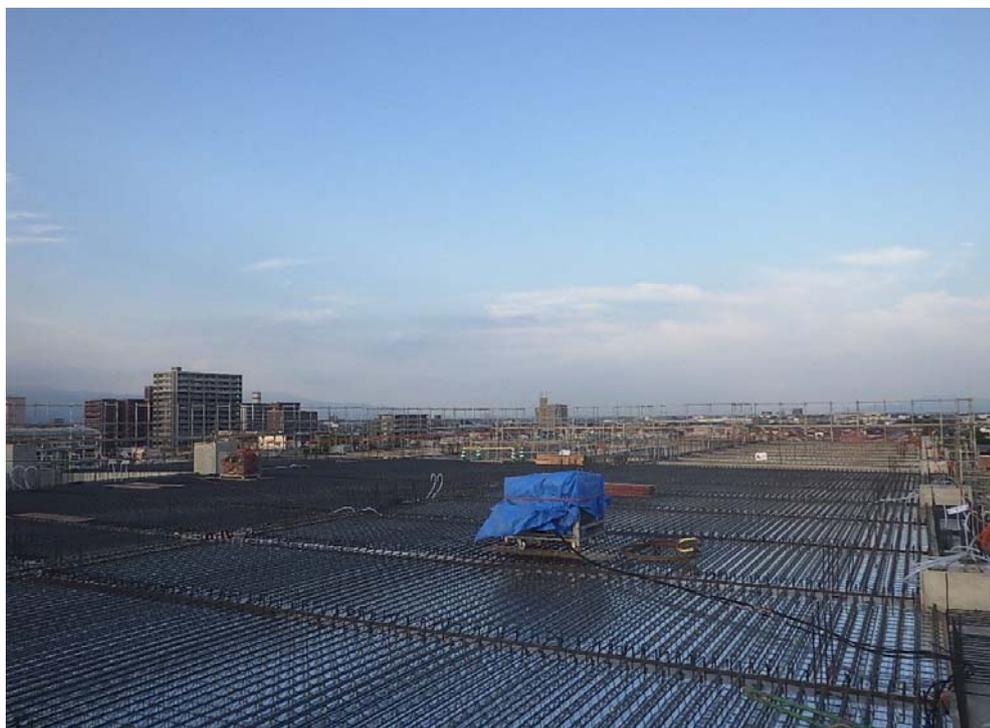

撮影内容 4 1工区 RFデッキ張り完了

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 5 1工区 RFスラブコンクリート完了



撮影内容 6 2工区 RF PC梁架設完了

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 7 2工区 RFスラブ配筋完了



撮影内容 8 2工区 RFスラブコンクリート打設完了(上棟)



撮影内容 9 1F 壁ボード張り状況



撮影内容 10 2F 壁軽鉄下地組状況

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 11

3F 天井内配管・配線状況



撮影内容 12

橋梁 桁架設完了

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 13 健診センター 全景写真(南西面より)



撮影内容 14 健診センター 全景写真(南東面より)
