


# 工 事 総 合 進 度 表

A

当月における工事の総合的な進行状況は、次の通りであります。  
(工事予定工期)

施工の進度

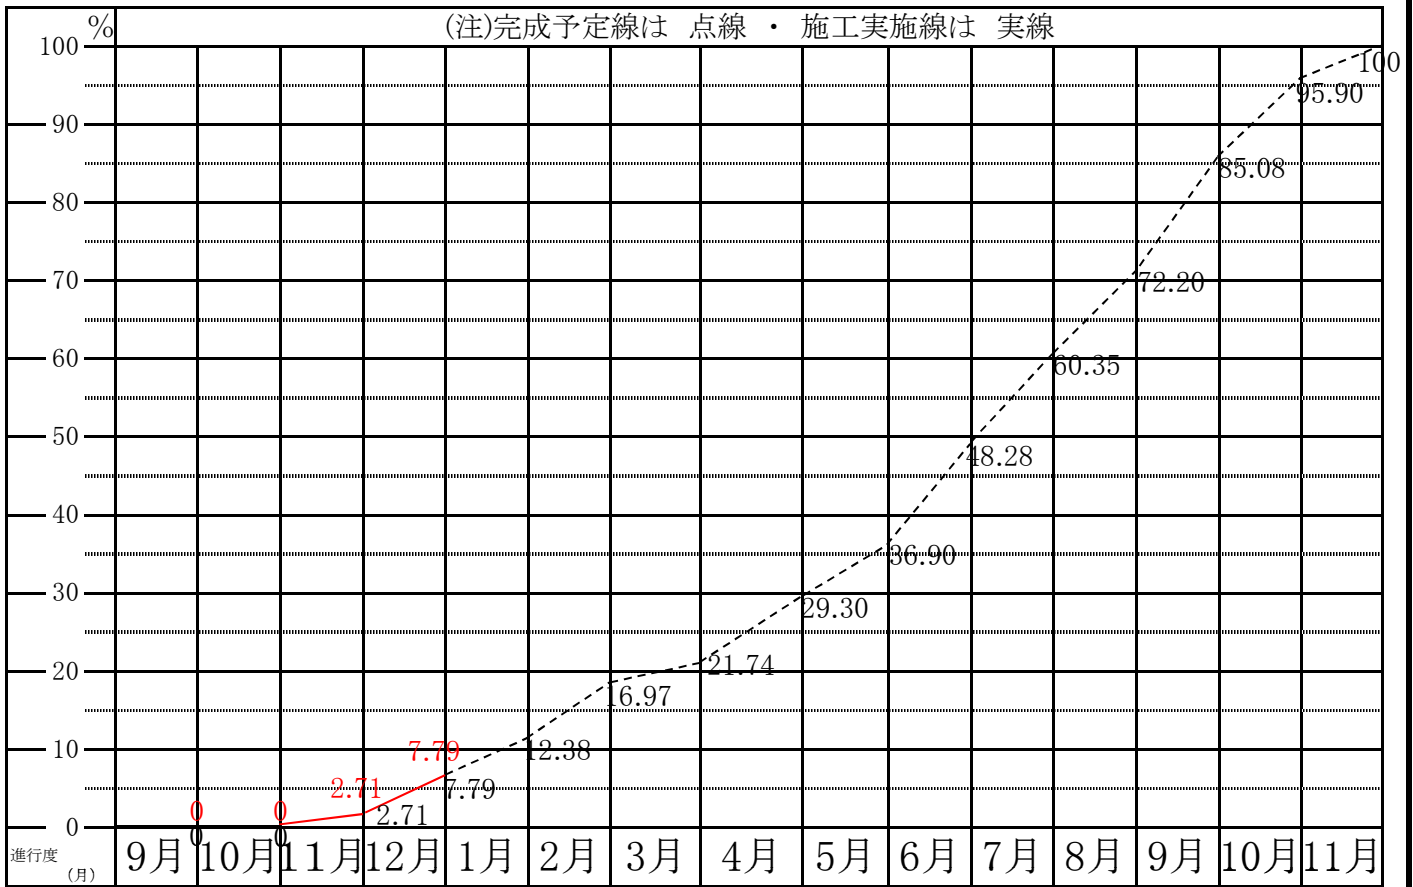

## 12 月 の 記 事

日	曜日	天気	記事	日	曜日	天気	記事
1	木	☉	杭工事	17	土	☉	杭工事 AI区 基礎根切・砕石地業
2	金	☉		18	日		全休
3	土	☉		19	月	☉	
4	日		全休	20	火	☉	
5	月	☉		21	水	☉	
6	火	☉		22	木	☉	
7	水	☉		23	金	☉	
8	木	☉		24	土	☉	AI区 捨てCON
9	金	☉		25	日		全休
10	土	☉		26	月	☉	AI区 墨出し
11	日		全休	27	火	☉	AI区 杭頭補強筋溶接、アンカーセット
12	月	☉	AI区 基礎根切・砕石地業	28	水	☉	B区 基礎根切・砕石地業
13	火	●		29	木	☉	
14	水	☉		30	金		年末年始休暇(12月30日～1月4日まで)
15	木	☉		31	土		
16	金	☉					

当月の作業に支障を及ぼした天候状態

凡例晴れ ☉ 曇 ☁ 雨 ● 暴風雨 ⊗ 雪 ⊕

## 当月の作業に支障を及ぼした天候状態

天候の状態による 作業不能日数	0 日	定休日数	6 日	実作業日数	25 日
--------------------	-----	------	-----	-------	------

# 工 事 別 進 度 表

B

[A] 工事の総合的な進行状態に対して、その工事別の進行状態は、次の通りであります。


種 別		完 成 予 定 工 事 量														工種 全体 (%)	工事の 進 度 率		
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			11月	
仮設	共通仮設工事																	2.53	20%
	直接仮設工事																	3.20	20%
基礎工事	土工事																	0.77	15%
	杭地業工事																	5.15	60%
躯体工事	コンクリート工事																	2.70	4%
	型枠工事																	3.89	0%
	鉄筋工事																	2.31	5%
	鉄骨工事																	3.05	0%
	既製コンクリート工事																	18.19	4%
仕上工事	防水工事																	1.05	0%
	タイル工事																	0.19	0%
	木工事																	0.13	0%
	金属工事																	3.87	0%
	左官工事																	1.14	0%
	金属製建具工事																	6.36	0%
	硝子工事																	0.51	0%
	塗装工事																	0.98	0%
	内外装工事																	4.45	0%
	仕上ユニット工事																	0.43	0%
	雑工事																	1.10	0%
外 構	外構工事																	2.15	0%
	昇降機設備工事																	0.73	0%
	厨房機器設備工事																	0.25	0%
	橋梁新設工事																	2.04	0%
	電気設備工事																	7.75	6%
	機械設備工事																	19.4	6%
	現場管理費																	5.7	15%
																計 100 %	7.79 %		

(出来高)

適 用



開始



完成



工事進度



完成工期

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 1 本杭施工状況 12月9日撮影



撮影内容 2 捨てコンクリート打設完了 12月24日撮影

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 3 杭偏芯確認状況 12月26日撮影



撮影内容 4 杭頭レベル確認状況 12月26日撮影

県立病院好生館跡地4団体複合施設新築工事(仮称)



撮影内容 5 全景写真 12月28日現在



撮影内容 6 全景写真 12月28日現在
